

AS GmbH B2B-Bestellportal

Projektdokumentation // Olesea Cretu


1. Meilensteine & Epics (MoSCoW)

ID	Epic / Meilenstein	Kurzbeschreibung	Priorität
E-01	Geschlossene Landingpage	Zentrales Login-Formular für Firmenkunden. Ohne Verifizierung sind keine Produkte oder Preise sichtbar.	M
E-02	Informationsseiten (B2B)	Zusätzliche administrative Seiten wie Impressum, B2B-AGB und Support-Kontakt.	M
E-03	B2B-Bestell-Matrix	Kompakte Tabellenübersicht des Katalogs zur Massenerfassung von Bestellungen per Tastatur.	M
E-04	Automatische Rabattberechnung	Live-Kalkulation der spezifischen Netto-Preise direkt in der Matrix je nach Firmenrabatt.	M
E-05	Schnellfilter & Suche	Effiziente Filterung nach Titel, Autor oder ISBN zur schnellen Navigation.	M
E-06	Admin-Authentifizierung	Sicherer Zugang für interne Vertriebsmitarbeiter zur Systemverwaltung.	M
E-07	Sammelbestellung auf Rechnung	Direkte Mengenerfassung in der Tabelle und Abschluss rein auf Rechnung.	M
E-08	Automatisierte Bestandspflege	Hintergrundlogik zur automatischen Echtzeit-Minimierung der Lagerbestände.	M
E-09	Stammdaten-CRUD (Backend)	Verwaltung von Buchdaten, aktuellen Beständen und Firmen-Rabattsätzen.	M
E-10	B2B-Umsatz-Dashboard	Statistische Übersicht der umsatzstärksten Firmenkunden für den Vertrieb.	S
E-11	API	Schnittstelle für zukünftige externe Systeme (Logistik/ Rechnungsdruck).	W

2. Projekt-Vorgangsliste

Vorgang	Aufgabe (B2B-Spezifisch)	Dauer (Stunden)	Vorgänger
A	Kickoff-Meeting (Projektauftrag & Rahmenabstimmung)	2 h	—
B	Anforderungen aufnehmen & Spezifikation (Erstellung des B2B-Lasten- & Pflichtenhefts)	6 h	A
C	Portal-Struktur definieren (geschlossener B2B-Bereich)	4 h	B
D	UI / UX - Design (Layout der tabellarischen Bestell-Matrix)	4 h	C
E	Hosting & Entwicklungsumgebung aufsetzen (XAMPP/Git)	2 h	B
F	Frontend-Implementierung (Loginmaske, kompakte Datentabelle)	15 h	D, E
G	Backend-Integration (Datenbank, komplexe Rabattlogik)	30 h	E
H	Content-Bereitstellung (Stammdaten für Test-Firmen & Produkte)	6 h	C, B
I	Testing (Validierung Login, Rabattberechnung & Rechnungskauf)	7 h	F, G, H
J	Reale Firmen- und Produktdaten einpflegen (MariaDB)	2 h	I
K	Go-Live (Bereitstellung des Portals für den Vertrieb)	2 h	J
Gesamt	Summe der Einzeltätigkeiten	80 h	

Netzplan B2B

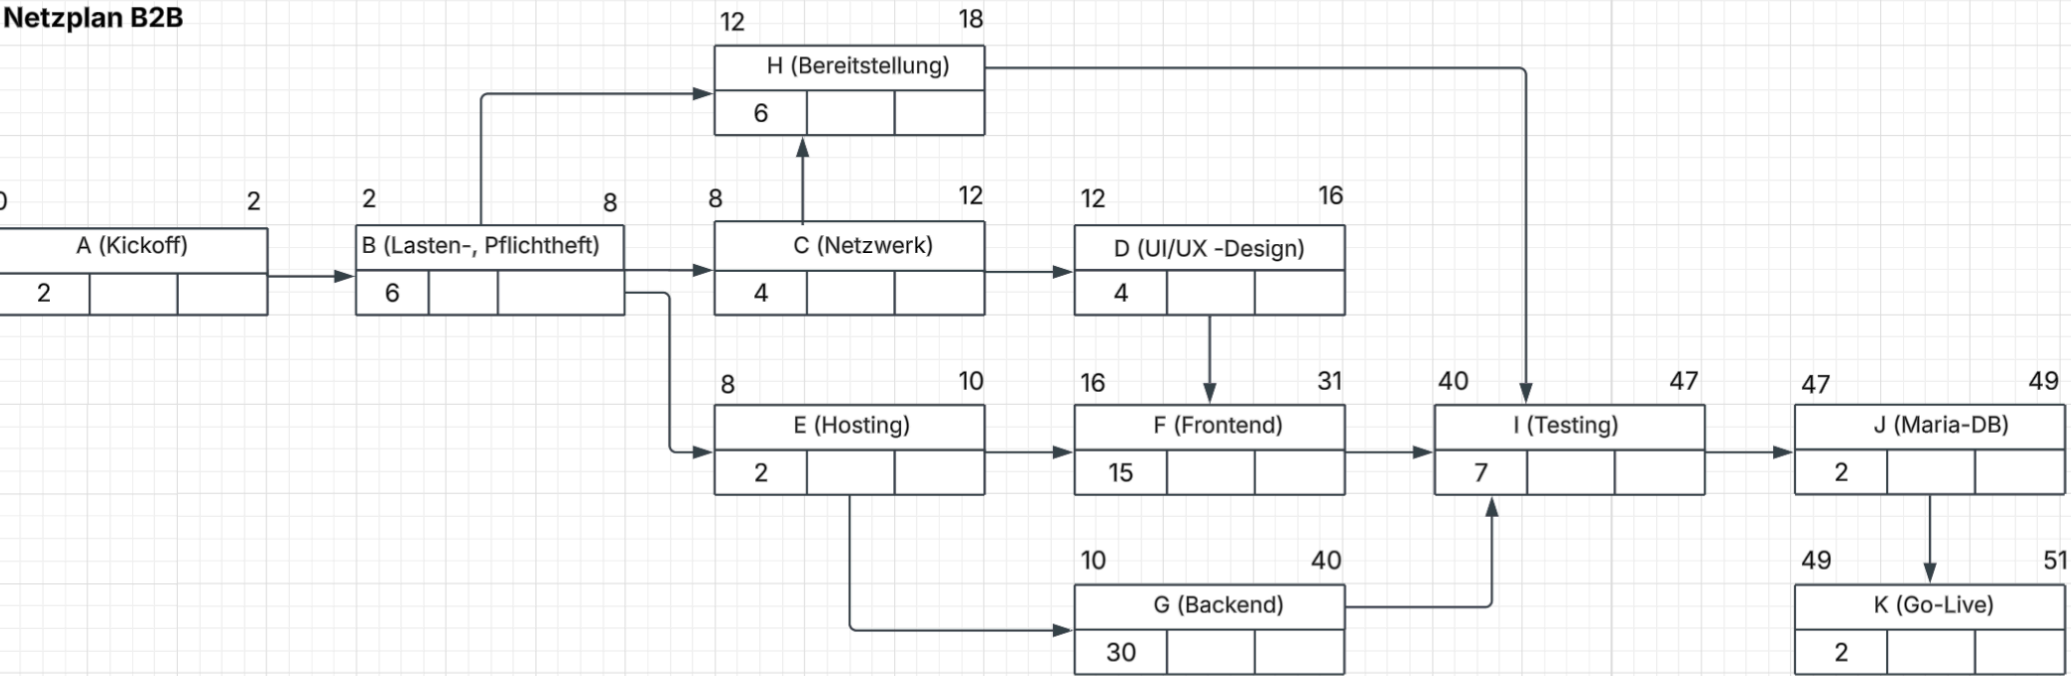

Hinweis: Die Vorgangsliste bildet meinen tatsächlichen Arbeitsaufwand von 80 Stunden ab. Da ich im Projektverlauf die Konzeption und die Frontend-Entwicklung parallel zur massiven 30-stündigen Backend-Integration durchführe, verkürzt sich die reale Durchlaufzeit des Projekts im Netzplan auf 51 Stunden. Die verbleibenden 29 Stunden laufen parallel und zeigen die hohe Prozesseffizienz und das logische Multitasking in meiner Ablaufplanung.
